


ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG; DỰ ÁN ĐẦU TU CÔNG	Mã hiệu: QT-02.KHTC
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 15/11/2019

MỤC LỤC


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH
2. PHẠM VI
3. TÀI LIỆU VIỆN DÂN
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
6. BIỂU MẪU
7. HỒ SƠ CẦN LUU

Trách nhiệm	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên	Trịnh Anh Đức	Nguyễn Huy Duẩn	Nông Quốc Tuấn
Chữ ký			
Chức vụ	Chuyên viên	Phó Vụ trưởng	Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH THĂM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG; DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG	Mã hiệu: QT-02.KHTC
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 15/11/2019

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

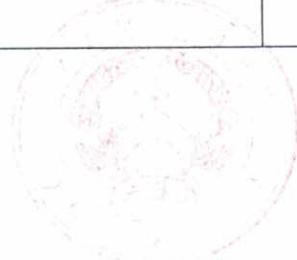

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG; DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG	Mã hiệu: QT-02.KHTC
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 15/11/2019

1. MỤC ĐÍCH

Quy định thống nhất trách nhiệm, trình tự nội dung thực hiện công việc trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Ủy ban Dân tộc.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này được áp dụng cho hoạt động thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Ủy ban Dân tộc.

Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện quy trình này

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
- Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Các văn bản liên quan có hiệu lực thi hành./.

4. TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt:

- NSNN: Ngân sách Nhà nước.
- LĐUB: Lãnh đạo Ủy ban.
- KHTC : Vụ Kế hoạch Tài chính.
- ĐTC: Đầu tư công

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG; DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG		Mã hiệu: QT-02.KHTC
	Lần ban hành: 01		
	Ngày ban hành: 15/11/2019		
TT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mô tả
5.1	Chuẩn bị hồ sơ	Thủ trưởng đơn vị	Chủ đầu tư dự án chuẩn bị các hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công theo quy định, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính
5.2	Xem xét hồ sơ	Lãnh đạo Vụ KHTC	Lãnh đạo Vụ KHTC giao công việc cho Phòng Kế hoạch Đầu tư Thống kê (phối hợp với Phòng Tài chính nếu có liên quan) xem xét, nhận xét
5.3	Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ	Chuyên viên chuyên quản thụ lý hồ sơ	Lập biên bản tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra danh mục các hồ sơ theo quy định. Trường hợp còn thiếu hoặc hồ sơ chưa hợp lệ, đề nghị bổ sung và thời điểm giao đầy đủ hồ sơ đúng pháp lý theo quy định được tính là ngày bắt đầu thẩm định.
5.4	Chuẩn bị nội dung thẩm định chủ trương, dự án đầu tư công	Chuyên viên Vụ KHTC	Chuyên viên xem xét tính pháp lý như sau: + Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định; + Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; + Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án quy định tại Khoản 2 Điều 47 của Luật Đầu tư công;

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH	Mã hiệu: QT-02.KHTC
	THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG; DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG	Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 15/11/2019

			+ Sự phù hợp với báo cáo thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; sự phù hợp giữa tổng mức đầu tư của dự án gắn với cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án; đánh giá các chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn trong quá trình khai thác dự án...	
5.7	Tổ chức họp thẩm định dự án đầu tư		Trên cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu của đơn vị đề nghị thẩm định. Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức họp thẩm định (theo Quyết định thành lập tổ thẩm định đã được phê duyệt) lập báo cáo thẩm định báo cáo chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án căn cứ các quy định của văn bản pháp luật hiện hành	
5.7	Phê duyệt dự án đầu tư	Lãnh đạo Ủy ban	Vụ KHTC chuẩn bị các văn bản phê duyệt và các tài liệu liên quan trình lãnh đạo ủy ban phê duyệt sau khi có kết quả thẩm định Chủ trương đầu tư; phê duyệt dự án	
5.8	Đối với các dự án chưa đủ điều	Lãnh đạo Vụ KHTC	Thông báo cho chủ đầu tư chuẩn bị lại hồ sơ (quay về bước 5.1)	

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG; DỰ ÁN ĐẦU TU CÔNG	Mã hiệu: QT-02.KHTC
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 15/11/2019

kiện thẩm định			
----------------	--	--	--

6. BIỂU MẪU

TT	Tên văn bản mẫu
1.	Sử dụng các mẫu ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan

7. HỒ SƠ CẦN LUÚ

TT	Tên hồ sơ	Nơi lưu trữ	Thời gian lưu trữ
1	Báo cáo thẩm định, Quyết định phê duyệt	Vụ KHTC, VPUB	Theo quy định hiện hành
2	Các tài liệu khác liên quan theo quy định hiện hành	Vụ KHTC, VPUB	
