


ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẦU THẦU	Mã hiệu: QT03-KHTC
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 10/9/2012

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH
2. PHẠM VI
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
6. BIỂU MẪU
7. HỒ SƠ CẦN LUU

TRÁCH NHIỆM	SOẠN THẢO	XEM XÉT	PHÊ DUYỆT
Họ tên	Nguyễn Thế Hoàng	Lê Sơn Hải	Hà Hung
Chữ ký		 Lê Sơn Hải	
Chức vụ	Chuyên viên Vụ Kế hoạch- Tài chính	Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính	Phó Chủ nhiệm Ủy ban

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐÁU THẦU	Mã hiệu: QT03-KHTC
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 10/9/2012

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẦU THẦU	Mã hiệu: QT03-KHTC
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 10/9/2012

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định thống nhất trách nhiệm, trình tự nội dung thực hiện công việc trong công tác phê duyệt kế hoạch và kiểm tra công tác đấu thầu của Ủy ban Dân tộc.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình này được áp dụng cho hoạt động thẩm định, phê duyệt kế hoạch và kiểm tra công tác đấu thầu của Ủy ban Dân tộc.

Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện quy trình này.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11.

Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 01/02/2010 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11.

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

4. ĐỊNH NGHĨA, CÁC TỪ VIẾT TẮT

4.1. Thuật ngữ:

Chủ đầu tư: là người sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Dự án đầu tư xây dựng cơ bản: là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bồi vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định. Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.


4.2. Chữ viết tắt:

- NSNN: Ngân sách Nhà nước.
- LĐUB: Lãnh đạo Ủy ban.
- KHTC : Vụ Kế hoạch Tài chính.

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẦU THẦU	Mã hiệu: QT03-KHTC
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 10/9/2012

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Hình 5.1 Lưu đồ Qui trình thẩm định kế hoạch đấu thầu.

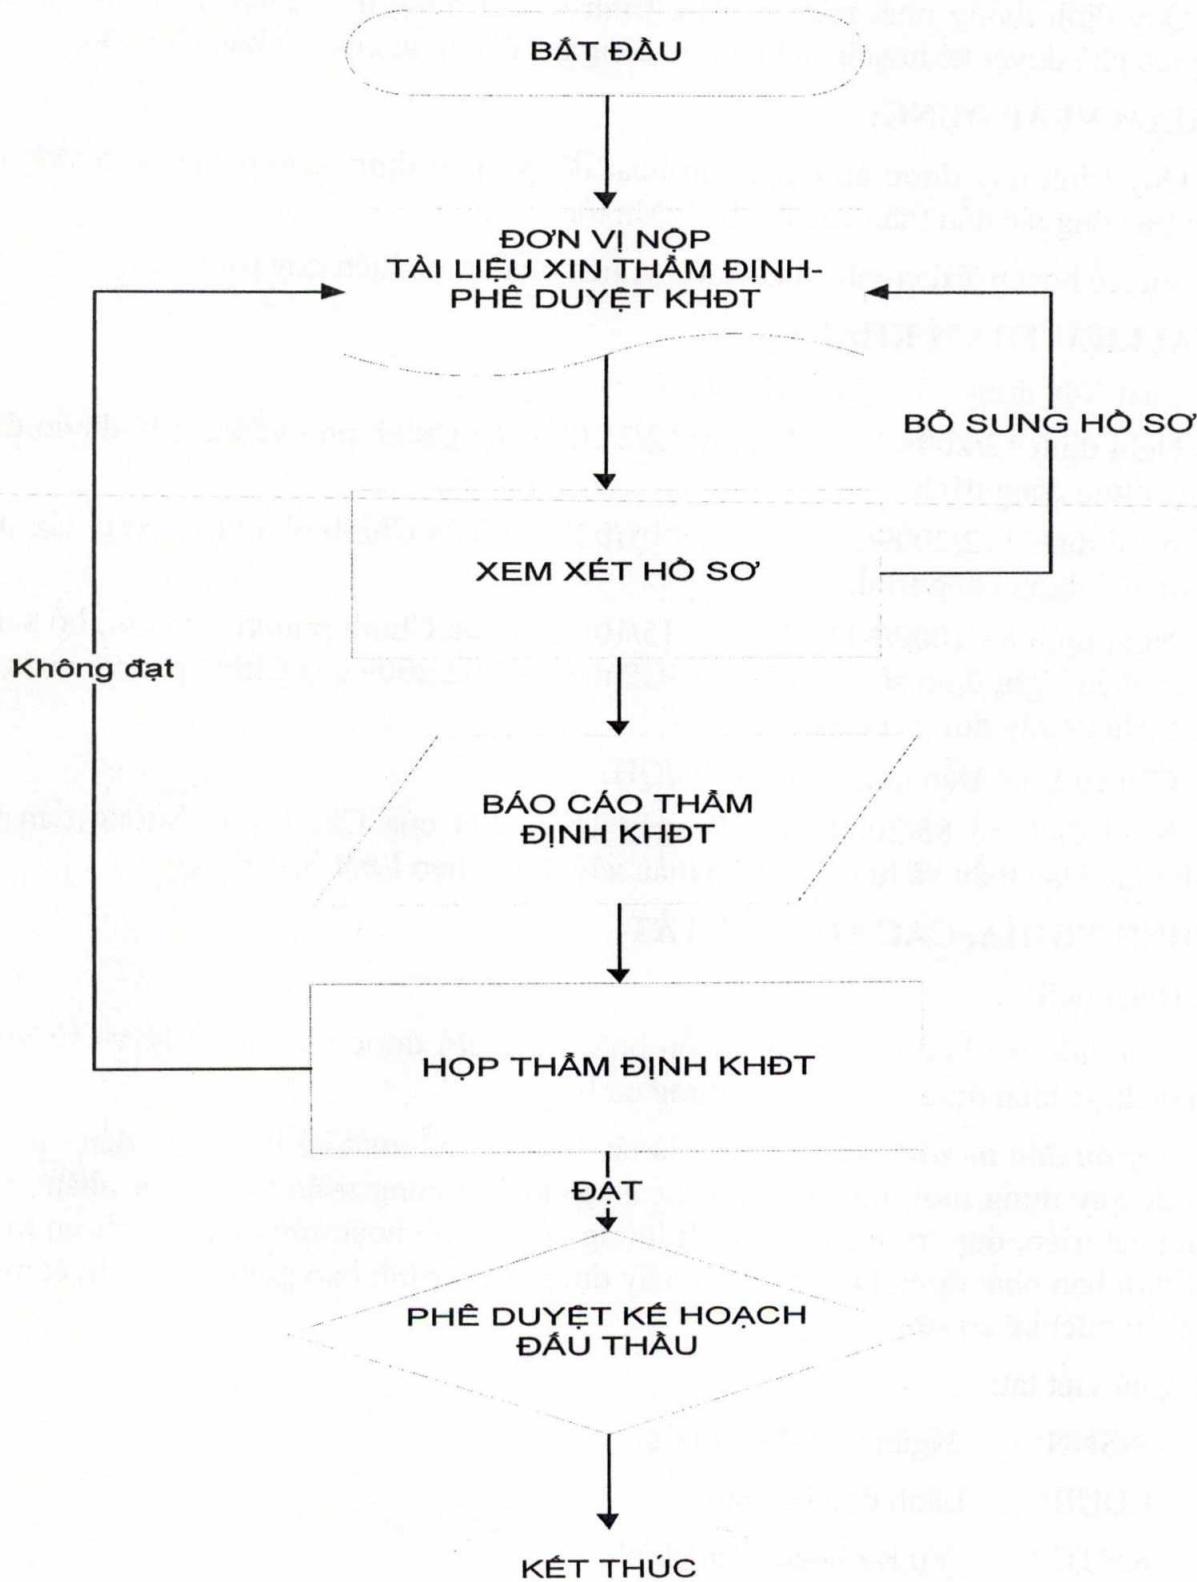

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẦU THẦU	Mã hiệu: QT03-KHTC
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 10/9/2012

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

TT	Hoạt động	Trách nhiệm	Mô tả	Biểu mẫu
5.1	<i>Chuẩn bị hồ sơ</i>	Thủ trưởng đơn vị cở sở	Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lập KHĐT theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 85/2009/NĐ-CP và có Tờ trình UBĐT phê duyệt, đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ đến Vụ Kế hoạch tài chính để thẩm định; <i>(theo Điều 9, Điều 10 Nghị định 85/2009/NĐ-CP)</i>	Tờ trình theo qui định
5.2	<i>Tiếp nhận hồ sơ</i>	Văn phòng Ủy ban	Văn phòng Ủy ban tiếp nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Ủy ban,	Phiếu giao việc.
5.3	<i>Chuyển hồ sơ cho đơn vị tham mưu</i>	Lãnh đạo Ủy ban	Giao cho Vụ KTTC là cơ quan tham mưu giải quyết	Phiếu giao việc.
5.4	<i>Xem xét hồ sơ.</i>	Lãnh đạo Vụ KHTC	Vụ Kế hoạch tài chính chịu trách nhiệm thẩm định KHĐT và lập báo cáo thẩm định <i>(theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 85/2009/NĐ-CP)</i>	
5.5	<i>Tổ chức họp thẩm định KHĐT</i>	Lãnh đạo Vụ KHTC	Vụ KHTC tổ chức họp thẩm định. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Vụ KHTC, các Vụ, đơn vị liên quan	
5.6	<i>Trình phê duyệt KHĐT</i>	Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo Vụ KHTC	Vụ KHTC chuẩn bị văn bản phê duyệt và các tài liệu liên quan trình Lãnh đạo ủy ban phê duyệt sau khi có kết quả thẩm định KHĐT. <i>(theo khoản 2 Điều 12 của Nghị định 85/2009/NĐ-CP)</i>	
5.7	<i>Phê duyệt</i>	Lãnh đạo UB	Xem xét, phê duyệt, chuyển QĐ cho Văn phòng Ủy ban phát hành	

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẦU THẦU	Mã hiệu: QT03-KHTC
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 10/9/2012

6. BIỂU MẪU

TT	Mã hiệu	Tên văn bản mẫu
1.	BM01/QT03-KHTC	Tờ trình xin phê duyệt HKĐT
2.		
3.		

7. HỒ SƠ CÂN LUU

TT	Tên hồ sơ	Nơi lưu trữ	Thời gian lưu trữ
1	Quyết định phê duyệt KHĐT	Vụ KHTC, VPUB	Theo q.định
2	Báo cáo thẩm định	Vụ KHTC, VPUB	Theo q.định
3	Các tài liệu liên quan theo quy định	Vụ KHTC, VPUB	Theo q.định

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẦU THẦU	Mã hiệu: QT03-KHTC
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 10/9/2012

[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN]
[TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTTr-

....., ngày tháng năm

TỜ TRÌNH
Phê duyệt kế hoạch đầu thầu
[Ghi tên dự án hoặc tên gói thầu]

Kính gửi: [Ghi tên người có thẩm quyền]

Căn cứ quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án [Ghi số quyết định và ngày tháng năm] của [Ghi tên người có thẩm quyền hoặc người quyết định phê duyệt dự án] về việc phê duyệt dự án [Ghi tên dự án được phê duyệt],

Căn cứ[Ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập KHĐT].

[Ghi tên chủ đầu tư] trình [Ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch đầu thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây.

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

Phản này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:

- Tên dự án;
- Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư;
- Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án;
- Nguồn vốn;
- Thời gian thực hiện dự án;
- Địa điểm, quy mô dự án;
- Các thông tin khác (nếu có).

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Biểu 1. Phản công việc đã thực hiện

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẦU THẦU	Mã hiệu: QT03-KHTC
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 10/9/2012

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Văn bản phê duyệt (nếu có) ⁽ⁱ⁾
1						
2						
...						
Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu						

Ghi chú: (1) Đối với các gói thầu đã thực hiện trước cần nêu tên văn bản phê duyệt (phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu như: chi phí cho ban quản lý dự án; chi phí đèn bù, giải phóng mặt bằng (nếu có); dự phòng phí và những khoản chi phí khác (nếu có).

Biểu 2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện
1			
2			
...			
Tổng cộng giá trị thực hiện			

IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

1. Biểu kê hoạch đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu bao gồm việc xác định số lượng các gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Kế hoạch đấu thầu được lập thành biểu như sau:

Biểu 3. Tổng hợp kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1								
2								
...								
Tổng cộng giá gói thầu								

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẦU THẦU	Mã hiệu: QT03-KHTC
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 10/9/2012

2. Giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu

a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu

- Tên gói thầu;
- Cơ sở phân chia các gói thầu.

Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ;

- + Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;
- + Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...);
- + Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu một lần.

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Giá gói thầu;

c) Nguồn vốn;

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu;

đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu;

e) Hình thức hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

V. PHẦN CÔNG VIỆC CHUA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU (NẾU CÓ)

VI. KIẾN NGHỊ

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẦU THẦU	Mã hiệu: QT03-KHTC
		Lần ban hành : 01
		Ngày ban hành: 10/9/2012

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, *[Ghi tên chủ đầu tư]* đề nghị người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kế hoạch đầu thầu *[Ghi tên gói thầu hoặc tên dự án]*.

Kính trình *[Ghi tên người có thẩm quyền]* xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- *[Ghi tên cơ quan/tổ chức thẩm định];*
-
- Lưu VT.

[ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
